

27.01.2026 № 297  
На 18-14/576 от 26.01.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

## О предоставлении фронта работ

В ответ на письмо 18-14/576 от 26.01.2026 ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о предоставлении фронта работ на следующих участках:

3.8 по гп:

- К1 (участки 48-65) – контейнеры убраны; временной паговой дороги в границах данного объекта нет; материалы не складированы на долгосрочный период, питающие кабеля и ограждения присутствуют только на 50% одного профиля (участок 65-66);

- К2 (участки 65-71) – контейнеры убраны; временной паговой дороги в границах данного объекта нет; материалы не складированы на долгосрочный период, питающие кабеля и ограждения присутствуют только на 50% одного профиля (72-71);

- В10 – питающие кабеля присутствуют на участке около 30% от возможностей строительства;

- В1 – питающие кабеля присутствуют на участке около 30% от возможностей строительства;

3.7 по гп:

- К1 (участок 56-64) – демонтаж плит будет осуществлен либо при наступлении благоприятных условий, либо при отсутствии фронта работ для подрядной УКС организации на других участках квартала;

- К2 (участок 16-22) – демонтаж плит будет осуществлен либо при наступлении благоприятных условий, либо при отсутствии фронта работ для подрядной УКС организации на других участках квартала (паговые плиты занимают 6м от всей длины участка); материалы убраны;

- В10(участок 16-т.Б, 15-т.3.7) – материалы убраны;

3.15 по гп:

- В10 – ограждения убраны, электрические кабеля убраны;

- В1 - ограждения убраны, электрические кабеля убраны.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» со своей стороны проводит всевозможные мероприятия для своевременного предоставления фронта работ для подрядных УП «УКС Мингорисполкома» организаций и недопущения простоя техники.

В свою очередь информируем вас о том, что до сих пор не производятся работы по строительству ПНС. Строительство остановлено на стадии котлована, что препятствует проезду строительной техники и уменьшает площади для складирования материалов.

Приложение 1 содержит фото с данными участками.

Начальник управления строительства




А.В. Коврик

3.7 по гп



3.8 по гп

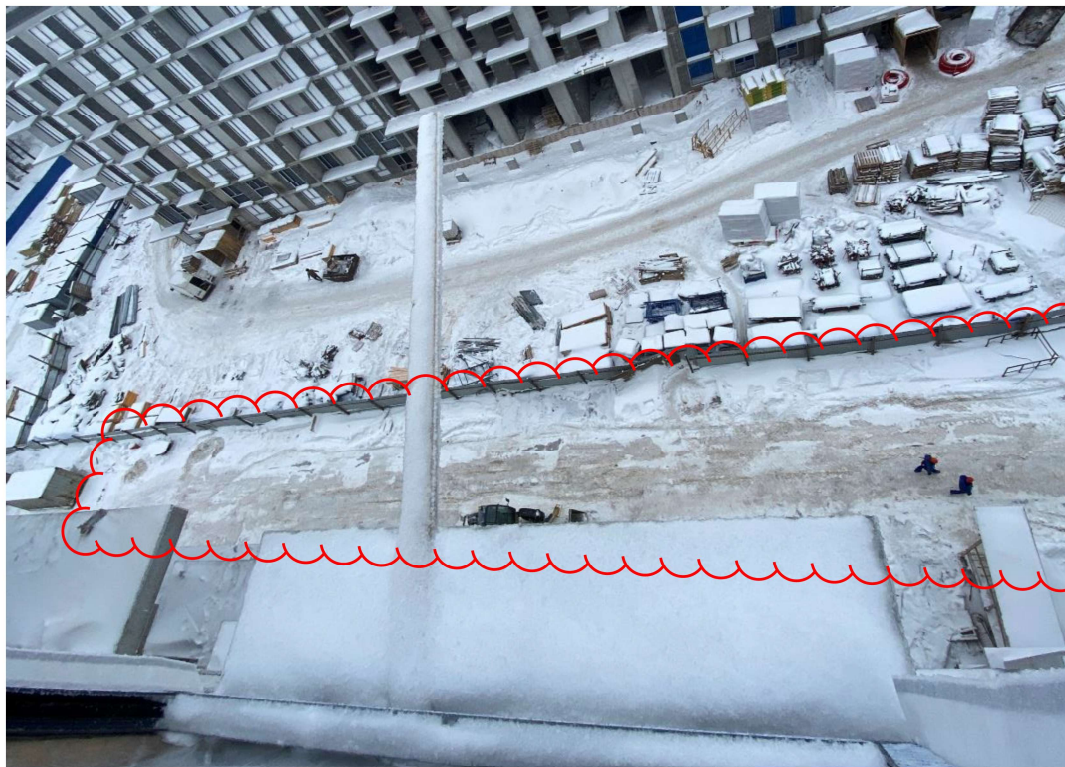

3.15 по гп



ПНС

