

РУП "Логойский комхоз"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

10

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 4



Е.О.Халимоненко
(инициалы, фамилия)

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " _____ " _____ 2024 г. № _____ в составе:

председатель комиссии	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:
«Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Школьной, аг.Гостиловичи, Логойского района, Минской области»
 установлено, что Состояние участка водопровода – неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. По всей длине
трубопровода имеются трещины и ржавчина. Требуется демонтаж стальных трубопроводов и замена их на полиэтиленовые с
установкой соответствующих фитингов. Ж/б элементы колодцев имеют трещины и изломы, местами разрушены, накрыты деревянными щитами. Необходима замена
водопроводных колодцев в местах врезки водопроводов, с установкой люков и соответствующих
фасонных частей и арматуры.





(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: -

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов: Экскаватор, бульдозер, кран
 (грузоподъемные механизмы, лопки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	 (подпись)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	 (подпись)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

Яндекс Карты

*д. Гостилевичи
ул. Школьная
490 метров*

Мемориал ВОВ

Детский сад

Гостилевичская школа

Гостилевичский СДК

Фастфуд

490 м



© Яндекс Условия использования

50 м

 Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

агродорок Гостилевичи

Минская область, Логойский сельсовет, агродорок Гостилевичи

РУП "Логойский комхоз"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

10



Е.О.Халимоненко
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 3

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " _____ " _____ 2024 г. № _____ в составе:

председатель комиссии	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:
«Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Садовой, д.Августово, Логойского района, Минской области»
 установлено, что Состояние участка водопровода – неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. По всей длине трубопровода имеются трещины и ржавчина. Требуется демонтаж стальных трубопроводов и замена их на полиэтиленовые с установкой соответствующих фитингов. Ж/б элементы колодцев имеют трещины и изломы, местами разрушены, накрыты деревянными щитами. Необходима замена водопроводных колодцев в местах врезки водопроводов, с установкой люков и соответствующих фасонных частей и арматуры.




(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: -

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов: Экскаватор, бульдозер, кран
(грузоподъемные механизмы, лопки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	 (подпись)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	 (подпись)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

*д. Авдустово
ул. Садовая*

Яндекс Карты



300 метров



© Яндекс Условия использования

50 м

 Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

деревня Чуденичи

Минская область, Логойский район, Острошицкий сельсовет, деревня Чуденичи

Код по ОКУД _____

РУП "Логойский комхоз"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

10 декабря 2024 г.

Е.О.Халимоненко
(инициалы, фамилия)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " _____ " _____ 2024 г. № _____ в составе:

председатель комиссии	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Партизанской, д. Чуденичи, Логойского района, Минской области»

установлено, что Состояние участка водопровода – неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. По всей длине трубопровода имеются трещины и ржавчина. Требуется демонтаж стальных трубопроводов и замена их на полиэтиленовые с

установкой соответствующих фитингов. Ж/б элементы колодцев имеют трещины и изломы, местами разрушены, накрыты деревянными щитами. Необходима замена водопроводных колодцев в местах врезки водопроводов, с установкой люков и соответствующих фасонных частей и арматуры.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: -

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов:

Экскаватор, бульдозер, кран

(грузоподъемные механизмы, лопки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:

Заместитель директора по ВКХ
(должность)

(подпись)

М.М.Богданов
(инициалы, фамилия)

члены комиссии:

инженер ПТО
(должность)

(подпись)

В.А.Александрова
(инициалы, фамилия)

мастер
(должность)

(подпись)

Н.А.Шорец
(инициалы, фамилия)


производитель работ
(должность)

(подпись)

Л.М.Питашина
(инициалы, фамилия)

д. Чуденичи
ул. Партизанская
700 м

Яндекс Карты

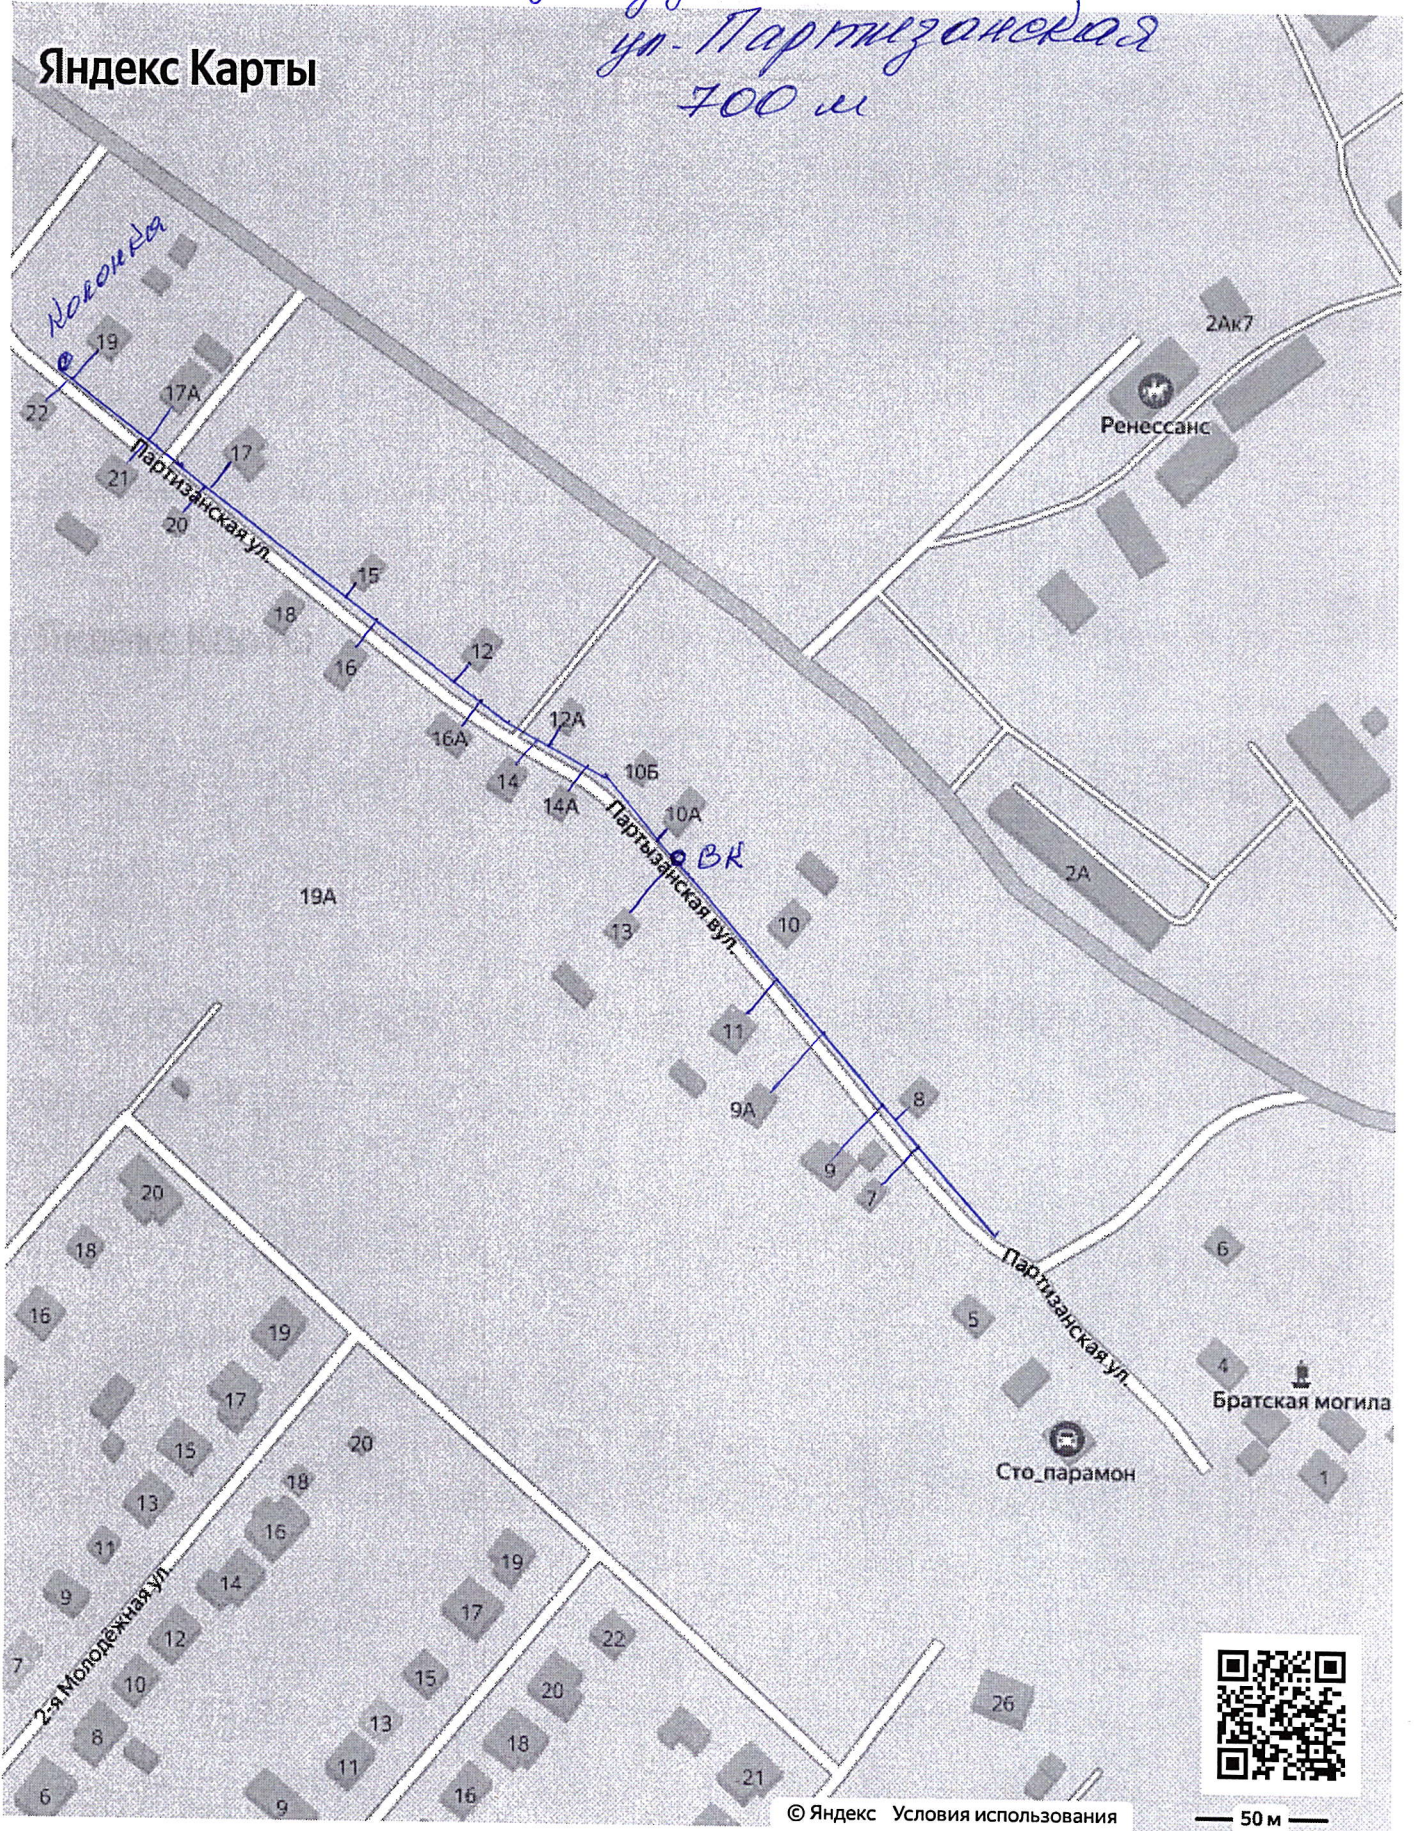

© Яндекс Условия использования

50 м

 Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

деревня Чуденичи

Минская область, Логойский район, Острошицкий сельсовет, деревня Чуденичи

Код по ОКУД

РУП "Логойский комхоз"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ Е.О.Халимоненко
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

10 декабря 2024 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1 _____ 2024 года № _____ в составе:



Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "

председатель комиссии	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Победы в г. Логойске, Минской области»

установлено, что Состояние участка водопровода – неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. По всей длине трубопровода имеются трещины и ржавчина. Требуется демонтаж стальных трубопроводов и замена их на полиэтиленовые с

установкой соответствующих фитингов. ЖБ элементы колодцев имеют трещины и изломы, местами разрушены, накрыты деревянными щитами. Необходима замена водопроводных колодцев в местах врезки водопроводов, с установкой люков и соответствующих фасонных частей и арматуры.





(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)


Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: -

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов: Экскаватор, бульдозер, кран
(грузоподъемные механизмы, лопаты электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:	<u>Заместитель директора по ВКХ</u> (должность)	 (подпись)	<u>М.М.Богданов</u> (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>инженер ПТО</u> (должность)	 (подпись)	<u>В.А.Александрова</u> (инициалы, фамилия)
	<u>мастер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Н.А.Шорец</u> (инициалы, фамилия)
	<u>производитель работ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Л.М.Питашина</u> (инициалы, фамилия)

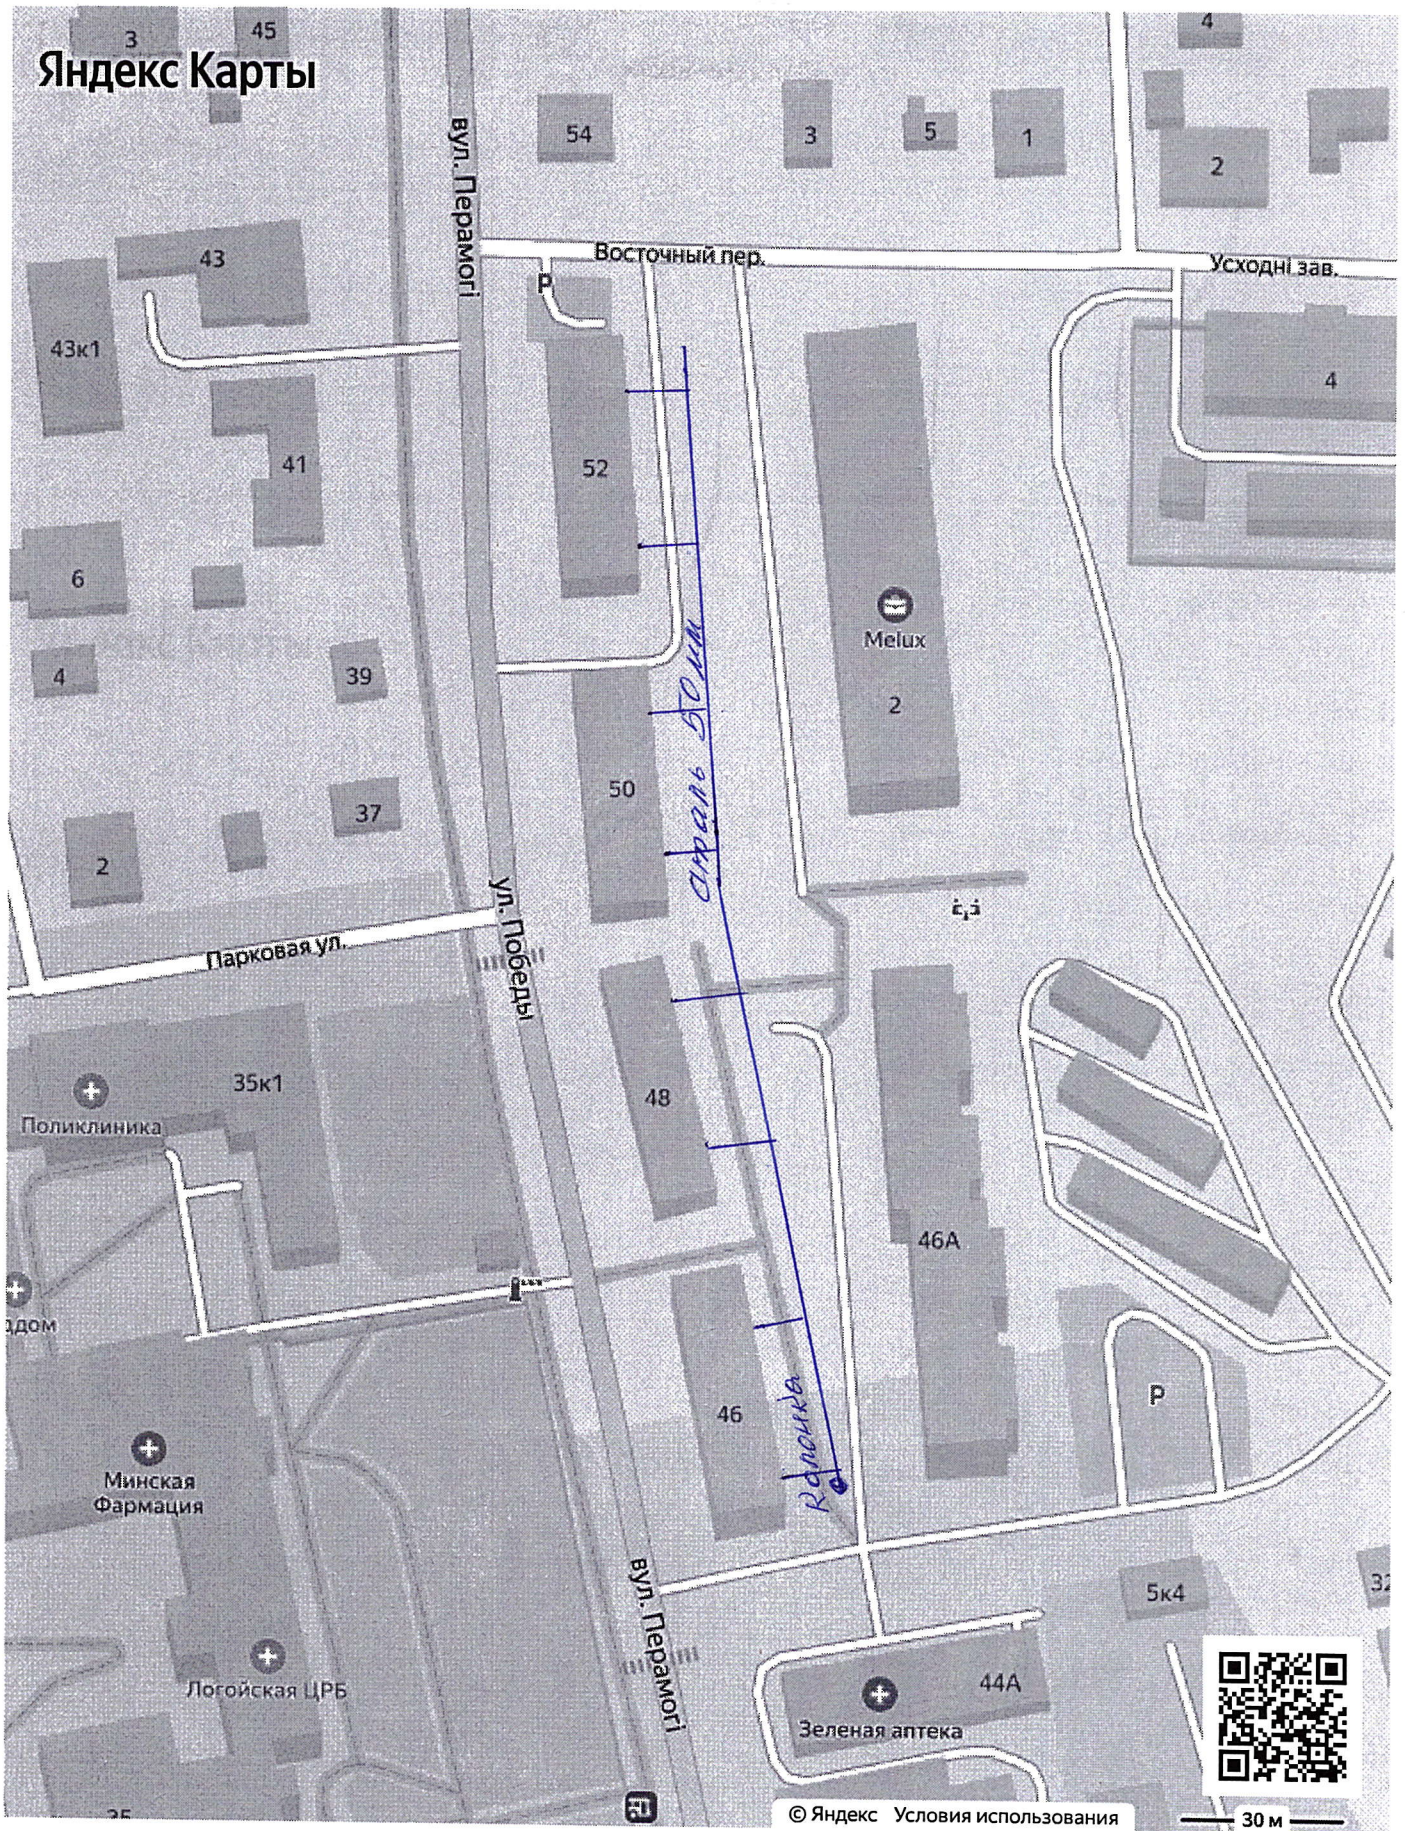

📍 Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

деревня Чуденичи

е. Логойск, ул. Победы

Минская область, Логойский район, Острошицкий сельсовет, деревня Чуденичи



© Яндекс Условия использования

30 м

 Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

агродорок Гостиловичи

Минская область, Логойский сельсовет, агродорок Гостиловичи

РУП «Логойский комхоз»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Е.О.Халимоненко

2024г



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия в составе:

председатель комиссии зам.директора ВКХ г.Логойска Богданов М. М.

члены комиссии: нач. участка ВКХ по г.п. Плещеницы Радевич А. И.

производитель работ Пяташина Л. М.

инженер ПТО Александрова В. А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Полевая г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Установлено, что состояние участка водопровода 620 м/п - неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. По всей длине трубопровода имеются трещины, деформация. Износ сетей 100 %. Во время эксплуатации возникали неоднократные порывы участков труб. Требуется демонтаж стальных трубопроводов d 50 и замена их на полиэтилен с установкой соответствующих фитингов. Необходима замена водопроводных колодцев в местах соединения веток водопровода с ул. Спортивной, ул. Луговой, пер. Пионерского с установкой люков и соответствующей запорной арматуры и фасонных частей. Необходимо произвести окольцовку сетей данной улицы с сетями ул. Луговой 120 м/п и пер. Спортивный с установкой дополнительных ж/б колодцев, люков, запорной арматуры и фасонных частей. При прокладке нового водопровода произвести переподключение существующих потребителей (38 абонентов). Общая протяженность участка 740 м/п.

Комиссией установлено наличие стесненных и осложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами _____

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: экскаваторы, бульдозеры, краны и др. _____

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:

Зам. директора ВКХ г. Логойска

Члены комиссий:

Начальник ВКХ по г. п. Плещеницы

Инженер ПТО

Производитель работ


М. М. Богданов

А. И. Радевич

В. А. Александрова


Л. М. Пяташина

на ул. Воровского

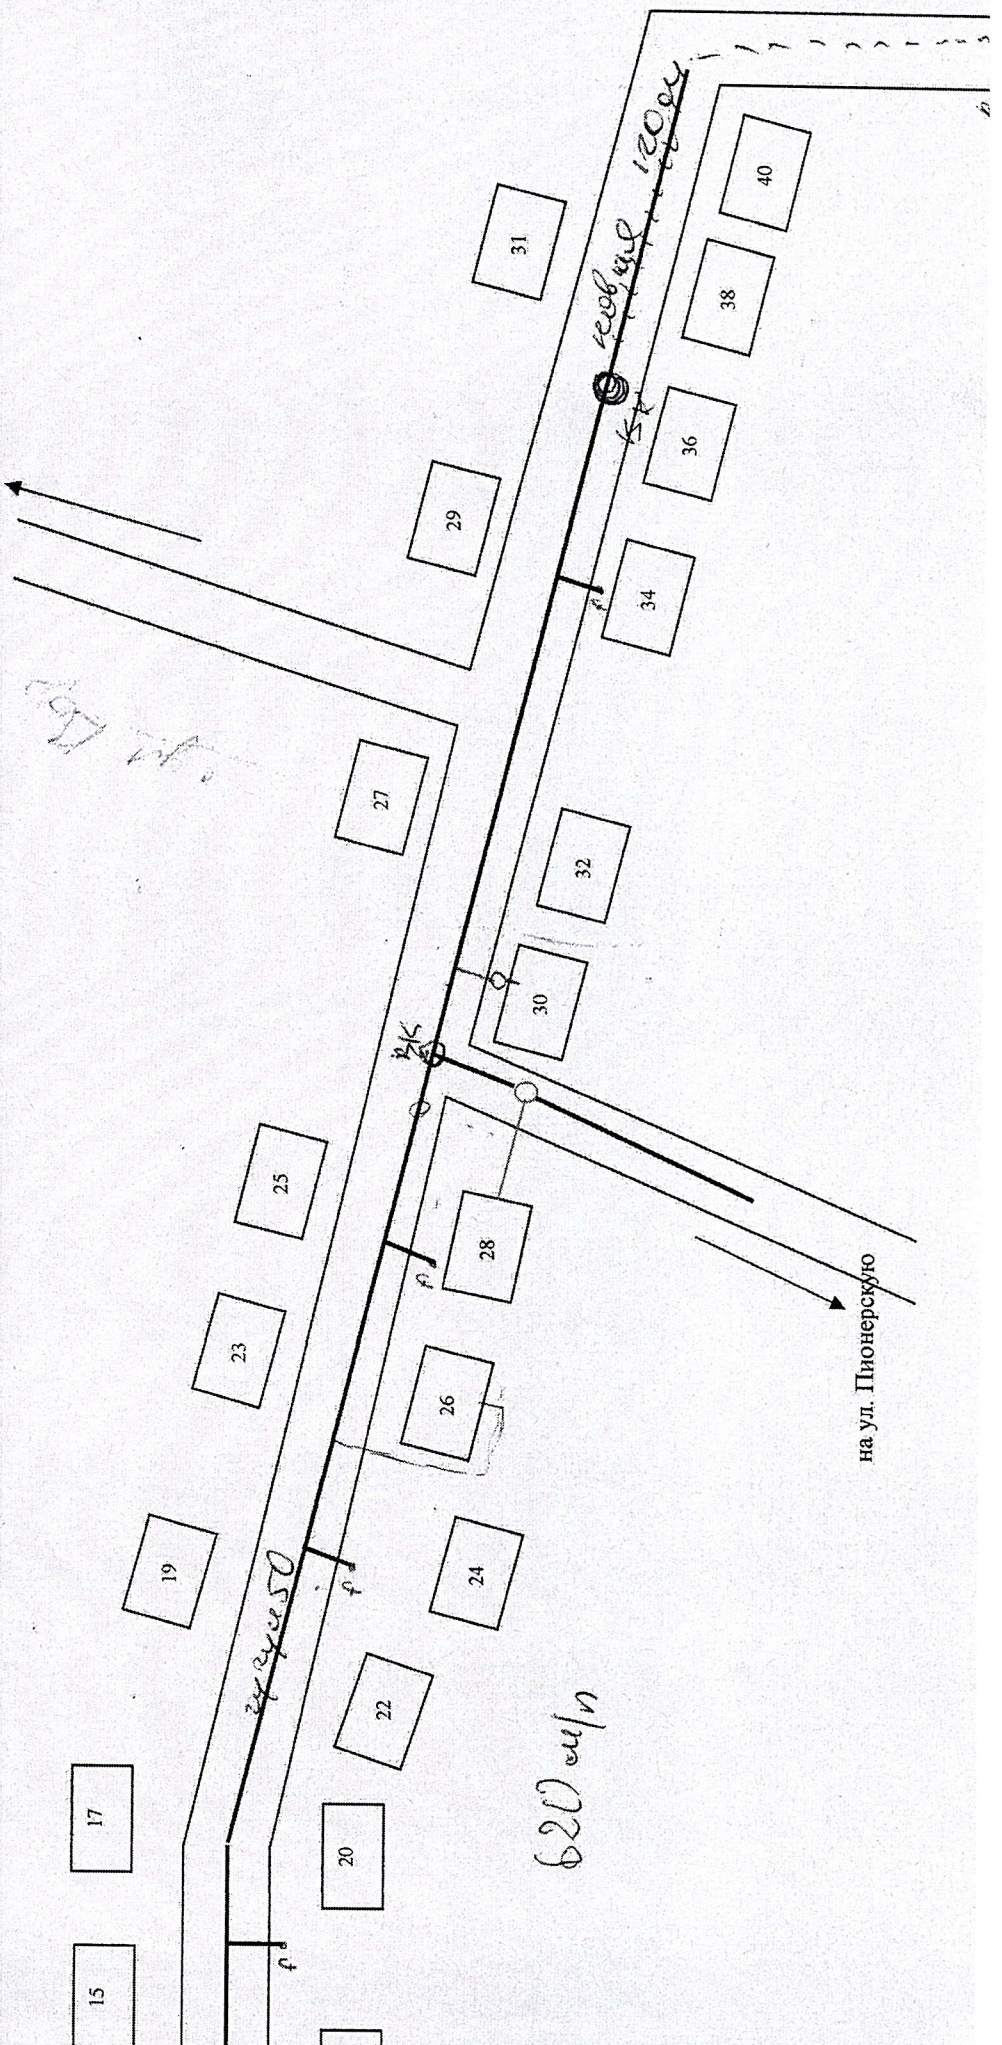

на ул. Пионерскую

620 м/п



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия в составе:

председатель комиссии зам.директора ВКХ г.Логойска Богданов М. М.
 члены комиссии: нач. участка ВКХ по г.п. Плещеницы Радевич А. И.
 производитель работ Пяташина Л. М.
 инженер ПТО Александрова В. А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Спортивная г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Установлено, что состояние участка водопровода 180 м/п - неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 50 лет. По всей длине трубопровода имеются трещины, деформация. Износ сетей 100 %. Во время эксплуатации возникали неоднократные порывы участков труб. Требуется демонтаж стальных трубопроводов d 70 и замена их на полиэтилен d 110 ПЭ с установкой соответствующих фитингов. Необходима замена водопроводных колодцев в местах соединения веток водопровода с пер. Полевым, ул. Пионерской, пер. Спортивным с установкой люков и соответствующей запорной арматуры и фасонных частей. При прокладке нового водопровода произвести переподключение существующих потребителей (4 абонента). Общая протяженность участка 180 м/п.

Комиссией установлено наличие стесненных и осложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами _____

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: экскаваторы, бульдозеры, краны и др. _____

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:
 Зам. директора ВКХ г. Логойска
 Члены комиссии:
 Начальник ВКХ по г. п. Плещеницы
 Инженер ПТО
 Производитель работ


М. М. Богданов

А. И. Радевич

В. А. Александрова

Л. М. Пяташина

Схема прокладки водопровода пер. Спортивный

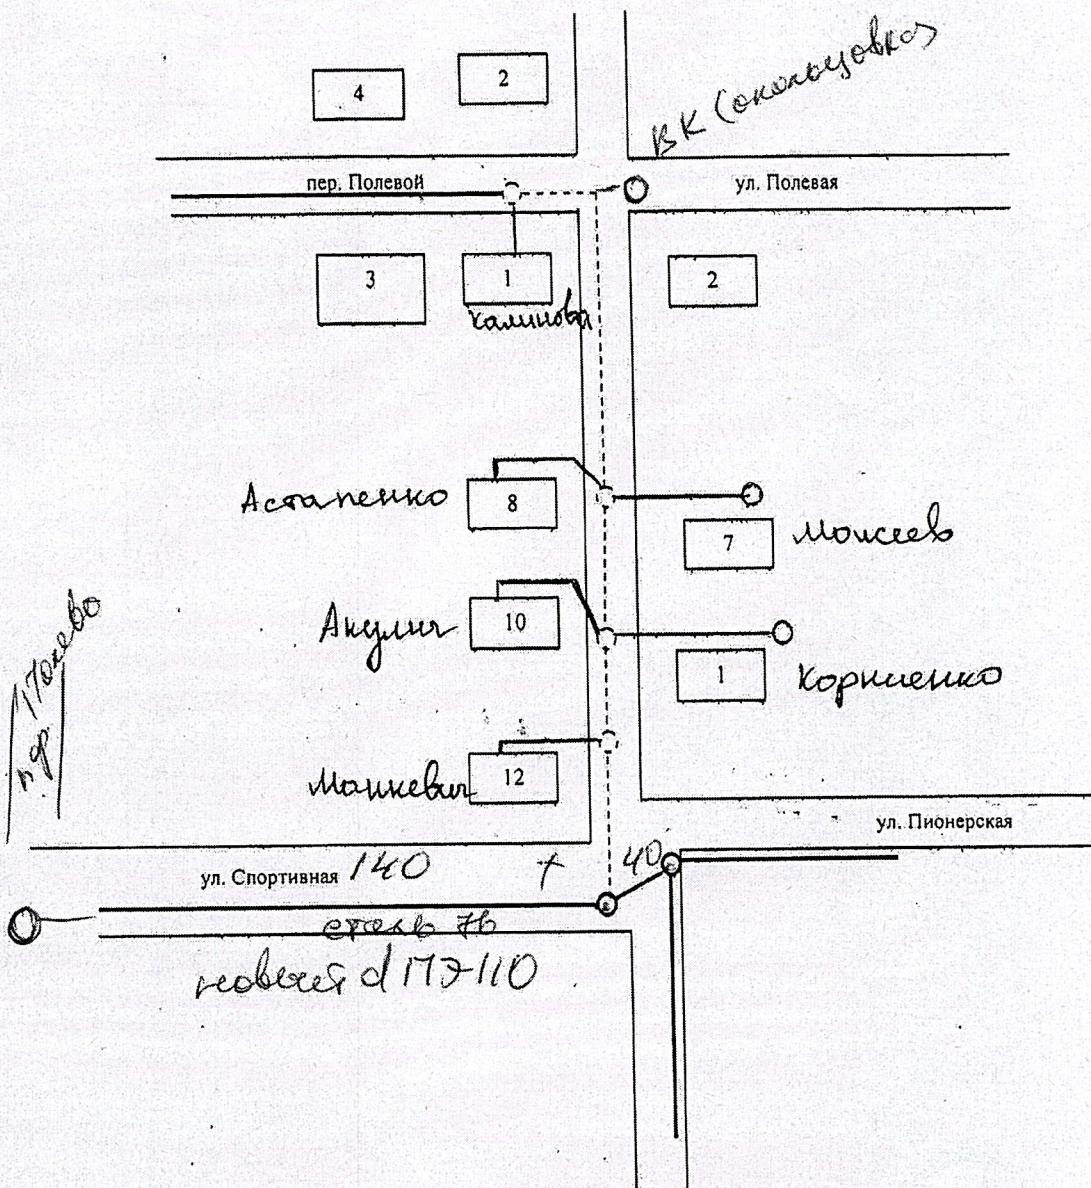

Инженер по экпл. соор. и обор. ВКХ
[Signature] О.А. Дригваль
 мастер ВХ *[Signature]* В.А. Халецкий

Условные обозначения:

————— водопровод существ.

- - - - - водопровод реконстр. (Ду 50, 150 м)

..... (Ду 25)

Код по ОКУД

Форма С-1

РУП «Логойский комхоз»

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Б.О. Калимоненко

2024г



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия в составе:

председатель комиссии зам.директора ВКХ г.Логойска Богданов М. М.

члены комиссии: нач. участка ВКХ по г.п. Плещеницы Радевич А. И.

производитель работ Пяташина Л. М.

инженер ПТО Александрова В. А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Пионерская г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Установлено, что состояние участка водопровода 460 м/п - неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. По всей длине трубопровода имеются трещины, деформация. Износ сетей 100 %. Во время эксплуатации возникали неоднократные порывы участков труб. Требуется демонтаж стальных трубопроводов d 70 и замена их на полиэтилен с установкой соответствующих фитингов. Необходима замена водопроводных колодцев в местах соединения веток водопровода с пер. Спортивным, ул. Луговой, проезд к ул. 8 Марта с установкой люков и соответствующей запорной арматуры и фасонных частей. Необходимо произвести окольцовку сетей данной улицы с сетями ул. 8 Марта 100 м/п и пер. Спортивный с установкой дополнительных ж/б колодцев, люков, запорной арматуры и фасонных частей. При прокладке нового водопровода произвести переподключение существующих потребителей (38 абонентов). Общая протяженность участка 560 м/п.

Комиссией установлено наличие стесненных и осложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: экскаваторы, бульдозеры, краны и др.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии:

Зам. директора ВКХ г. Логойска

Члены комиссии:

Начальник ВКХ по г. п. Плещеницы

Инженер ПТО

Производитель работ

М. М. Богданов

А. И. Радевич

В. А. Александрова


Л. М. Пяташина

U

2 m

УСТРОЙСТВО ПУТЕЙ


Устройство путей

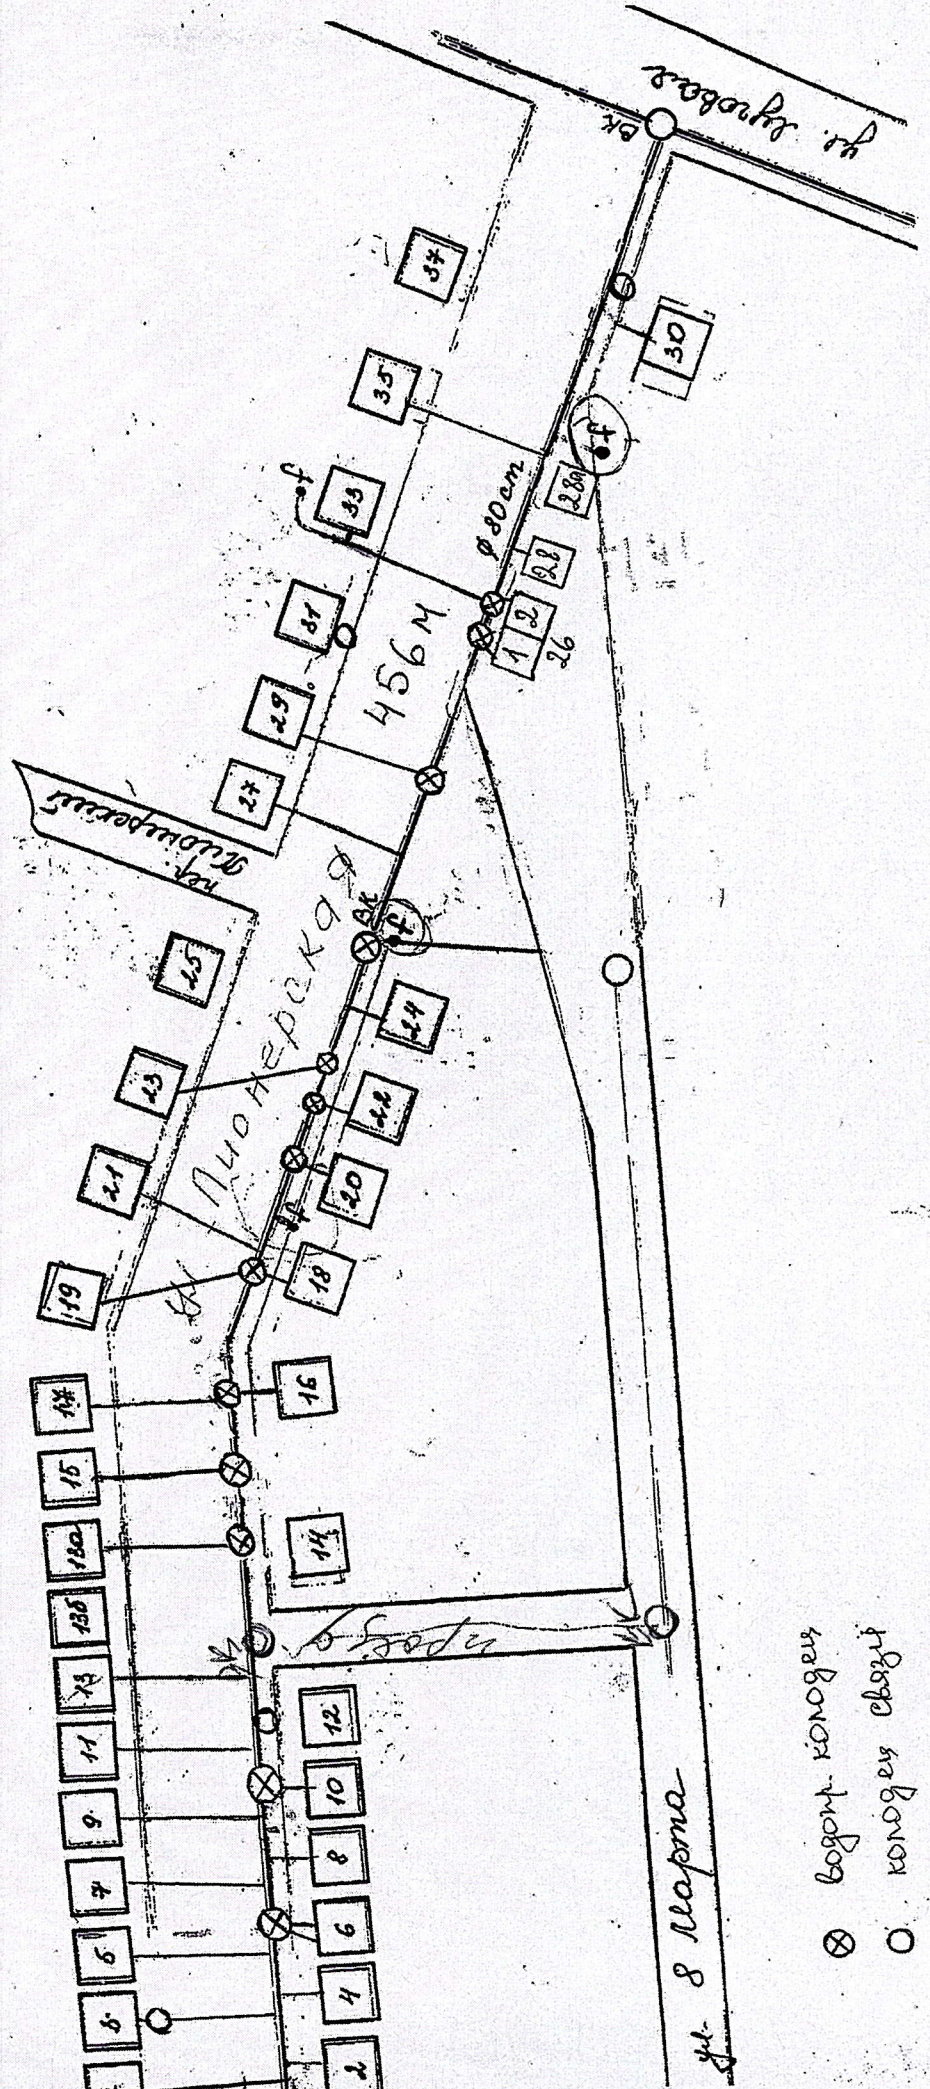

- ⊗ боком. конюез
- конюез черт

Код по ОКУД

Форма С-1



РУП «Логойский комхоз»

УТВЕРЖДАЮ

Е.О.Халимоненко

2024г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия в составе:

председатель комиссии зам.директора ВКХ г.Логойска Богданов М. М.
члены комиссии: нач. участка ВКХ по г.п. Плещеницы Радевич А. И.
производитель работ Пяташина Л. М.
инженер ПТО Александрова В. А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Зелёному г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Установлено, что на участке водопровода по пер. Зелёному заужен диаметр центрального водопровода, что приводит в летний период к недостаточному давлению у абонентов. Необходимо заменить участок водопровода с d ПЭ 32 на d ПЭ 100 с переподключением 8 (восьми) абонентов.

Произвести окольцовку сетей водопровода пер. Зелёный, ул. Центральная и объединить в общую магистральную сеть d ПЭ100.

Комиссией установлено наличие стесненных и осложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами _____

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: экскаваторы, бульдозеры, краны и др. _____

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:
Зам. директора ВКХ г. Логойска
Члены комиссии:
Начальник ВКХ по г. п. Плещеницы
Инженер ПТО
Производитель работ

М. М. Богданов

А. И. Радевич

В. А. Александрова

Л. М. Пяташина

БК 1
переход БК 1

высота
на 110
БК
пер. БК 1
73 9 32

пер. БК 2

АТКВАЖИНА

4.100

01121
YA
ИСПИТАНИЕ

Резерв


01121

Зачислено ПЗ д 32 на ПЗ 63-100

ИЗДЕЛОК 818 ЗАЧИСЛЕН 800.00

Код по ОКУД

Форма С-1



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия в составе:

председатель комиссии зам.директора ВКХ г.Логойска Богданов М. М.
члены комиссии: нач. участка ВКХ по г.п. Плещеницы Радевич А. И.
производитель работ Пяташина Л. М.
инженер ПТО Александрова В. А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мира г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Установлено, что состояние участка водопровода по ул. Мира от ул. Совхозной до пер. Мира 260 м/п - неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. В отдельных участках трубопровода имеются дефекты, деформация. Износ сетей 100 %. В летний период имелись неоднократные обращения по вопросу недостаточного давления в сети абонентов в сети абонентов пер. Мира, пер.Нагорный, ул. Луговая. Сети не окольцованы, часть абонентов подключена с ул. Олимпийской через частные домовладения.

Необходимо произвести прокладку водопровода d ПЭ 63 по ул. Мира от ул. Совхозной до ул. Луговой с подключением веток водопровода ул. Совхозная, ул. Олимпийская, пер. Мира, пер. Нагорный, ул. Луговая.

Произвести тем самым окольцовку системы водоснабжения м-на Коммуна и соединить артскважины Луговая и УОР магистральной сетью.

Комиссией установлено наличие стесненных и осложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: экскаваторы, бульдозеры, краны и

др.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии:

Зам. директора ВКХ г. Логойска

Члены комиссии:

Начальник ВКХ по г. п. Плещеницы

Инженер ПТО



Производитель работ

М. М. Богданов

А. И. Радевич

В. А. Александрова


Л. М. Пяташина

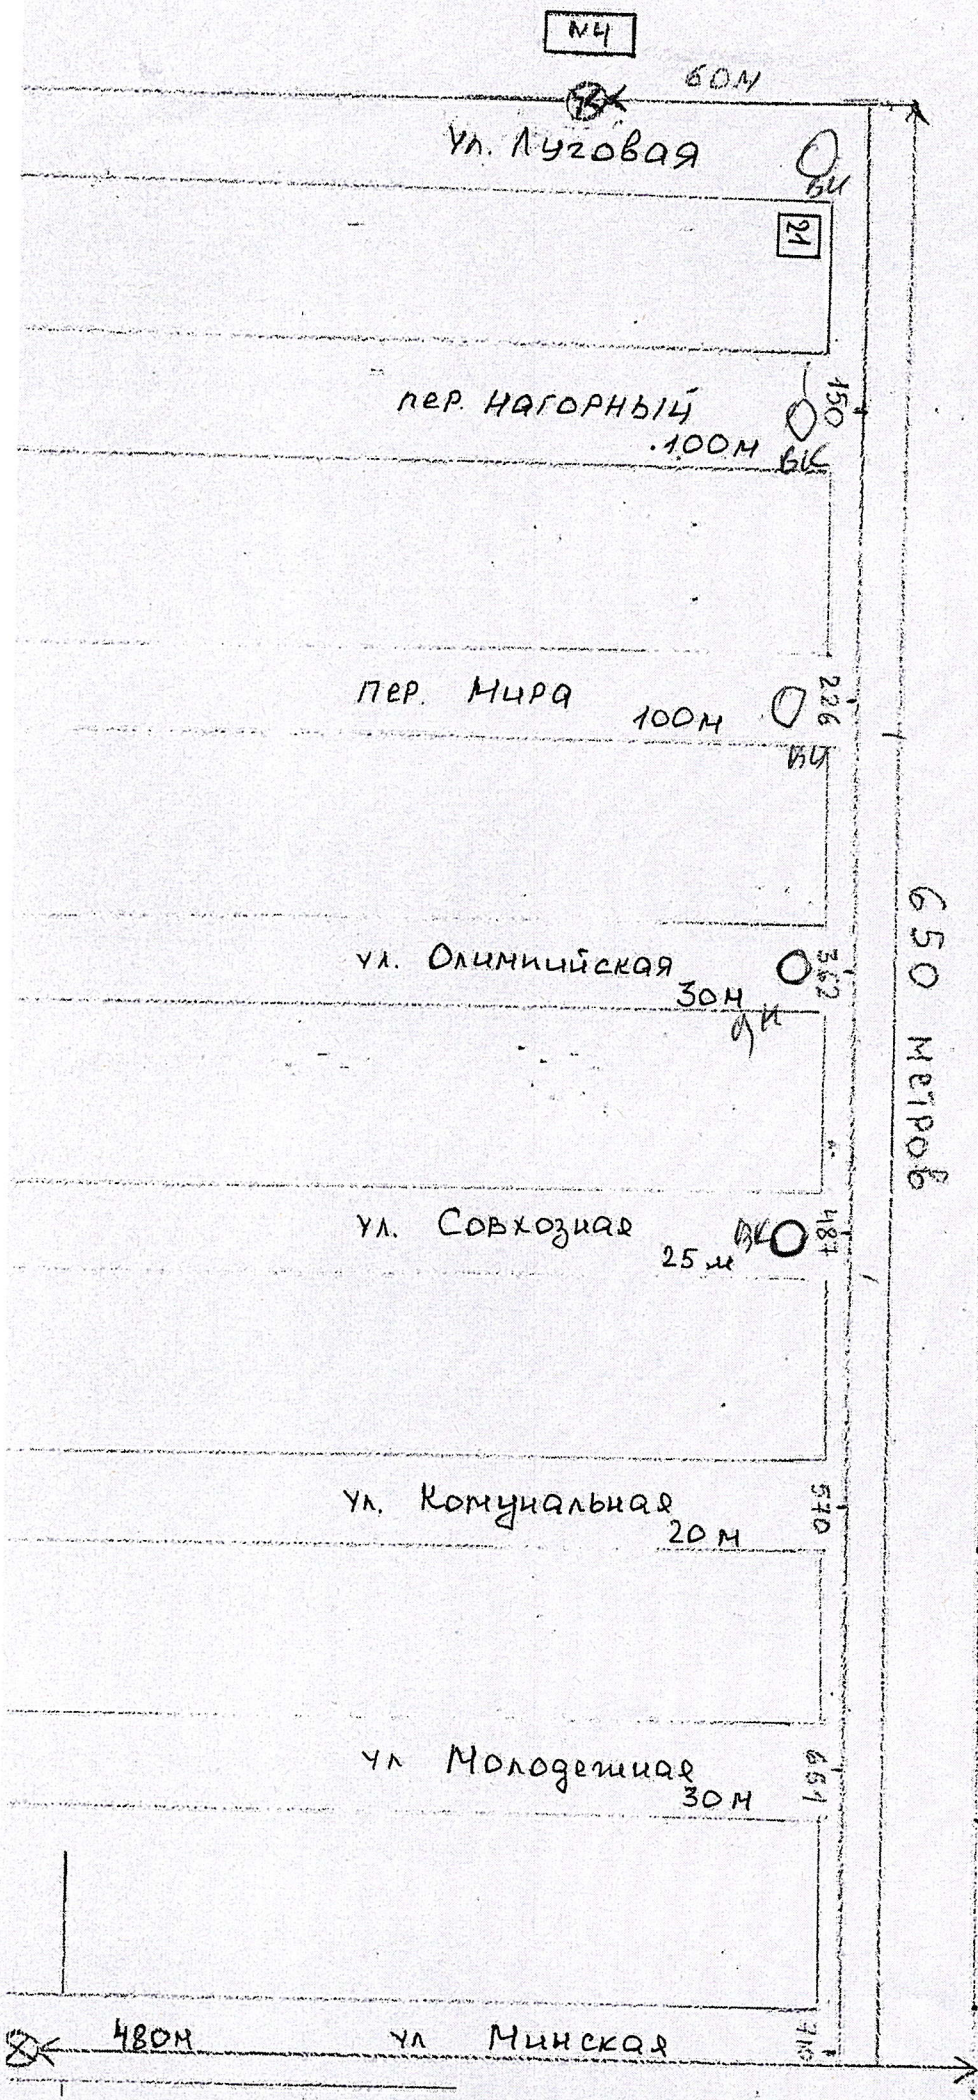

улица

Мира

650 метров



РУИ «Логойский комхоз»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Е.О.Халимоненко

2024г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия в составе:

председатель комиссии зам.директора ВКХ г.Логойска Богданов М. М.

члены комиссии: нач. участка ВКХ по г.п. Плещеницы Радевич А. И.

производитель работ Пяташина Л. М.

инженер ПТО Александрова В. А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. 8 Марта г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Установлено, что состояние участков водопровода 100 м/п - неудовлетворительное. Срок эксплуатации более 30 лет. В отдельных участках трубопровода имеются трещины, деформация. Износ сетей 100 %. Во время эксплуатации возникали неоднократные порывы участков труб. Требуется частичная замена участков на полиэтилен d 50 ПЭ с установкой соответствующих фитингов. Необходима замена водопроводных колодцев в местах соединения веток водопровода с ул. Совхозной и ул. Пионерской с установкой люков и соответствующей запорной арматуры и фасонных частей. При прокладке нового водопровода произвести переподключение существующих потребителей (10 абонентов). Общая протяженность участка 100 м/п.

Комиссией установлено наличие стесненных и осложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами _____

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: экскаваторы, бульдозеры, краны и др. _____

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Председатель комиссии:
Зам. директора ВКХ г. Логойска

М. М. Богданов

Члены комиссии:
Начальник ВКХ по г. п. Плещеницы
Инженер ПТО
Производитель работ

А. И. Радевич

В. А. Александрова

Л. М. Пяташина

улица 8-ое Марта

400 метров

