

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35BPSB30121021320109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВPSBVY2X
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35BPSB30121021320109330000

Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВPSBVY2X
УНП 100302261, ОКПО 01279547

« 26 » февраля 2025 г. № 395
на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Начальнику филиала СУ-26
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Хендогину А.В.

О корректировке ПСД
Школа Красноармейская

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул.Красноармейской, 11» направляет в Ваш адрес исполнительную съемку полов на отм.+7.300; +11.150. По данным съемки, проектная толщина схемы полов по типам 6,7,10*,33,34,36,37,41,50,52,57 не соответствует фактической.

Просим направить данную съемку в проектную организацию, для корректировки проектно-сметной документации.

Приложение: исполнительная съемка на 4-х листах.

Начальник филиала

П.И. Жминько

Светенков
+375 17 3563777

Интегрированная система менеджмента
качества, экологии, охраны труда
соответствует требованиям МС ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001



Сертифицировано
Русским Регистром



Исполнительная съемка поверхности полов на отм.+7.300

по объекту: "Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией
специализированного для образования и воспитания (здание школы №4)
по ул.Красноармейской, 11


№п/п	Тип пола	Толщина пирога проектная, мм	Толщина пирога фактическая, мм
1	Δ 6	310	от 370 до 400
2	Δ 33	300	от 300 до 440
3	Δ 36	380	400
4	Δ 37	350	от 400 до 515
5	Δ 57	240	от 320 до 340

Производитель работ
филиала СУ-68 ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4"



И.В.Вайтович

Утверждаю
Главный инженер П. Г. Коуров

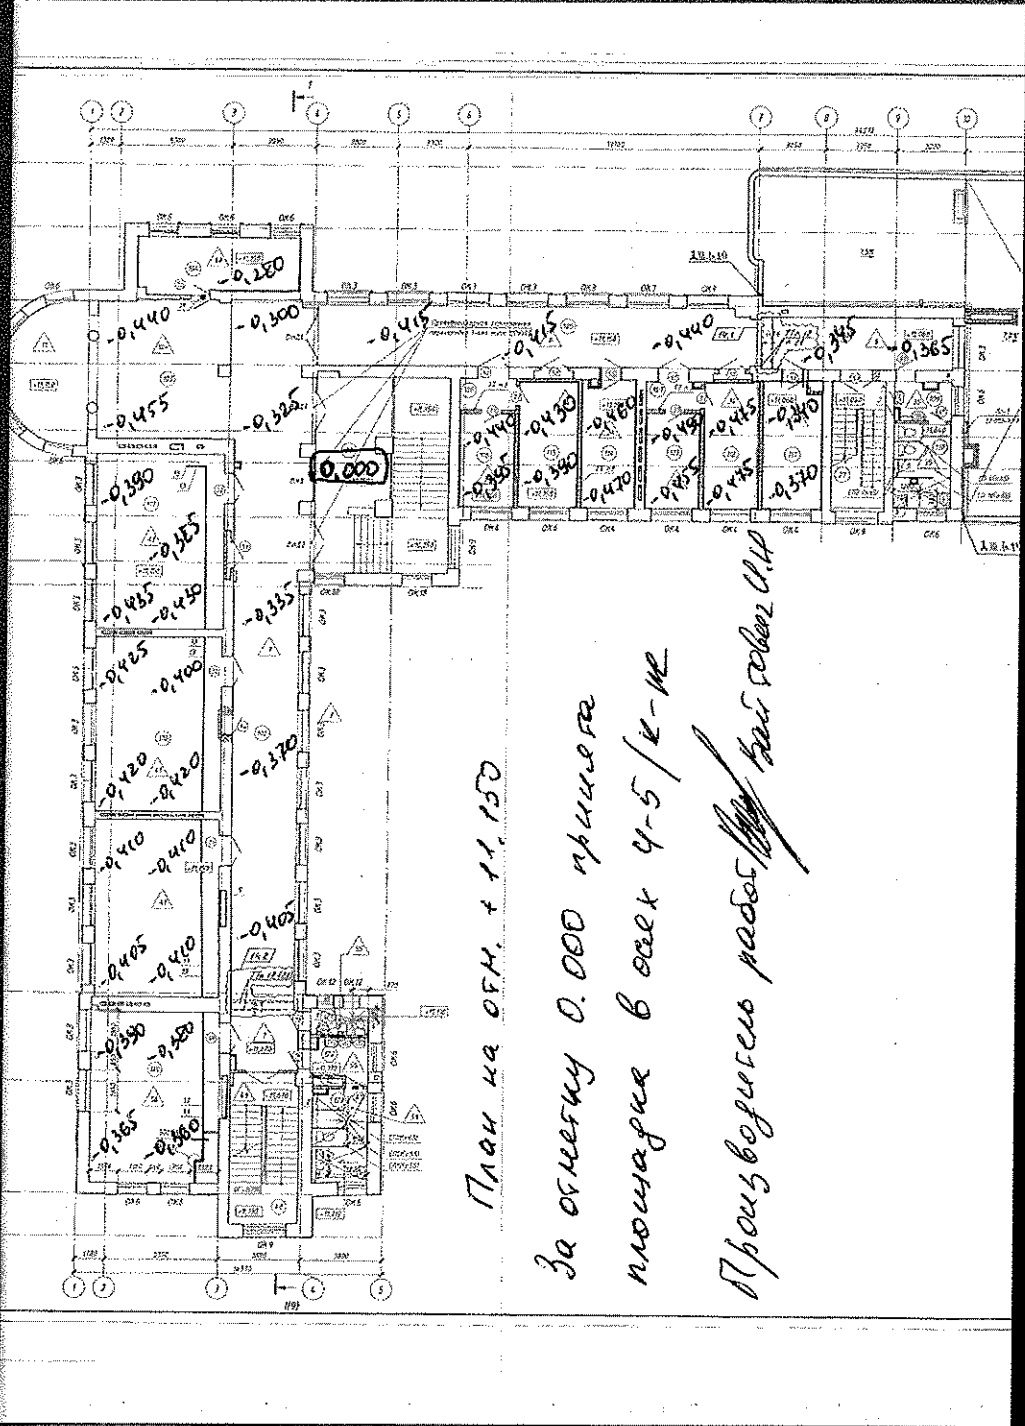

План на отметку +11,150

За отметку 0.000 признать
помещение в осях 4-5 / К-12
Производится работ ~~по~~ для работ Д.П.

Исполнительная съемка поверхности полов на отм.+11.150

по объекту: "Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул.Красноармейской, 11

№п/п	Тип пола	Толщина пирога проектная, мм	Толщина пирога фактическая, мм
1	Δ 6	310	от 415 до 440
2	Δ 7	290	от 335 до 405
3	Δ 10*	330	от 300 до 455
4	Δ 34	310	от 390 до 490
5	Δ 41	250	от 390 до 490
6	Δ 50	170	от 360 до 390
7	Δ 52	220	от 340 до 370

Производитель работ
филиала СУ-68 ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4"



И.В.Вайтович
